

# 第 1 1 回 中心市街地 復興まちづくり推進委員会

令和 7 年 2 月 2 5 日 (火) 1 8 時 0 0 分～  
人 吉 市







各復興事業の進捗について


# 紺屋町土地区画整理事業 (換地)

2月14日(金)、紺屋町土地区画整理審議会において、第2回仮換地指定の答申を受け、すべての各地の仮換地指定を予定


## 仮換地指定の状況

項目	指定 街区数	指定 画地数
地区全体数(分母)	6街区	39画地
第1期指定(R6.3.1)	1街区 (16.7%)	26画地 (66.7%)
第2期指定(R7.3.1予定)	5街区 (83.3%)	13画地 (33.3%)
計	6街区 (100.0%)	33画地 (100.0%)

凡例	
	道路
	河川
	公園
	施行区域界
1街区~5街区	街区番号
	第1期指定済み
	第2期指定(予定)

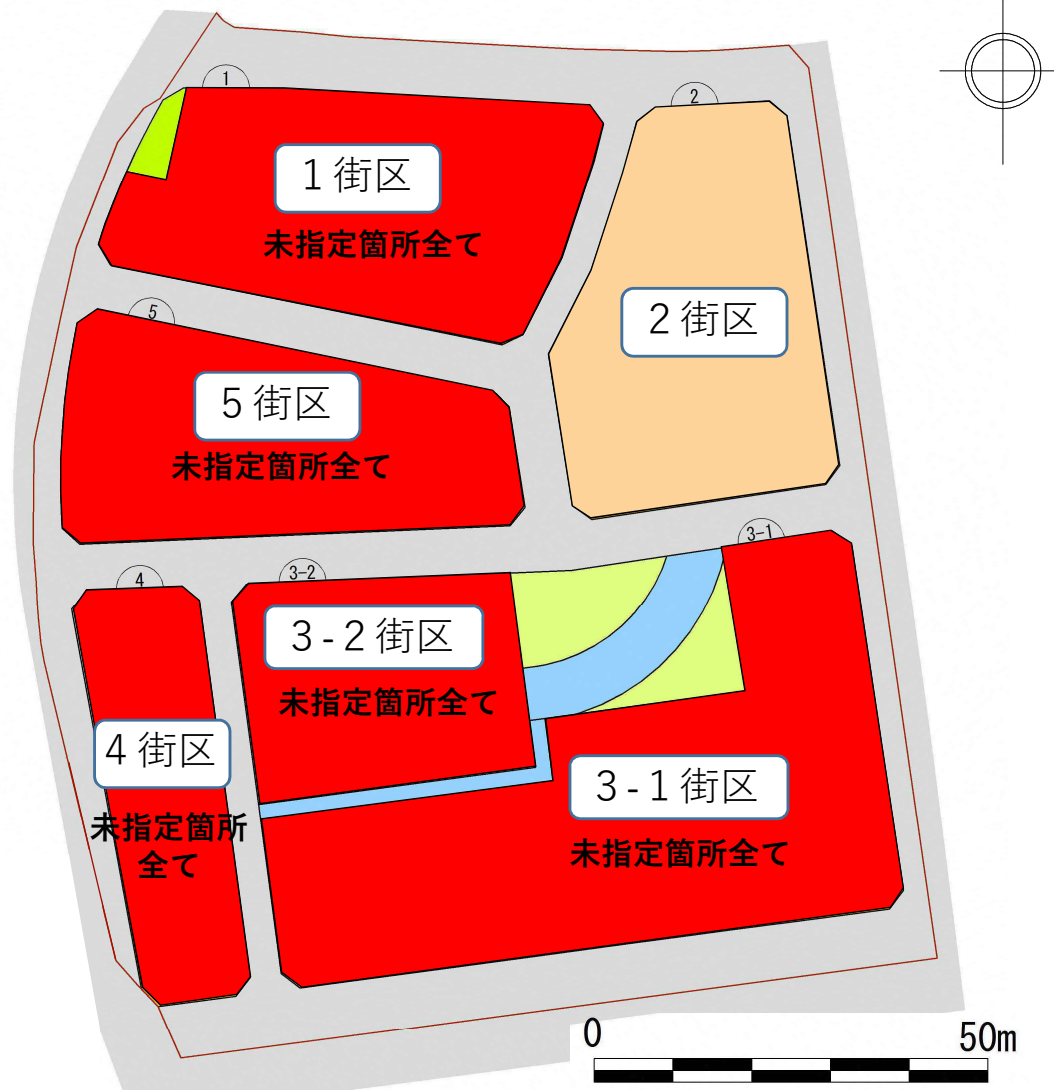

# 紺屋町土地区画整理事業 (工事)

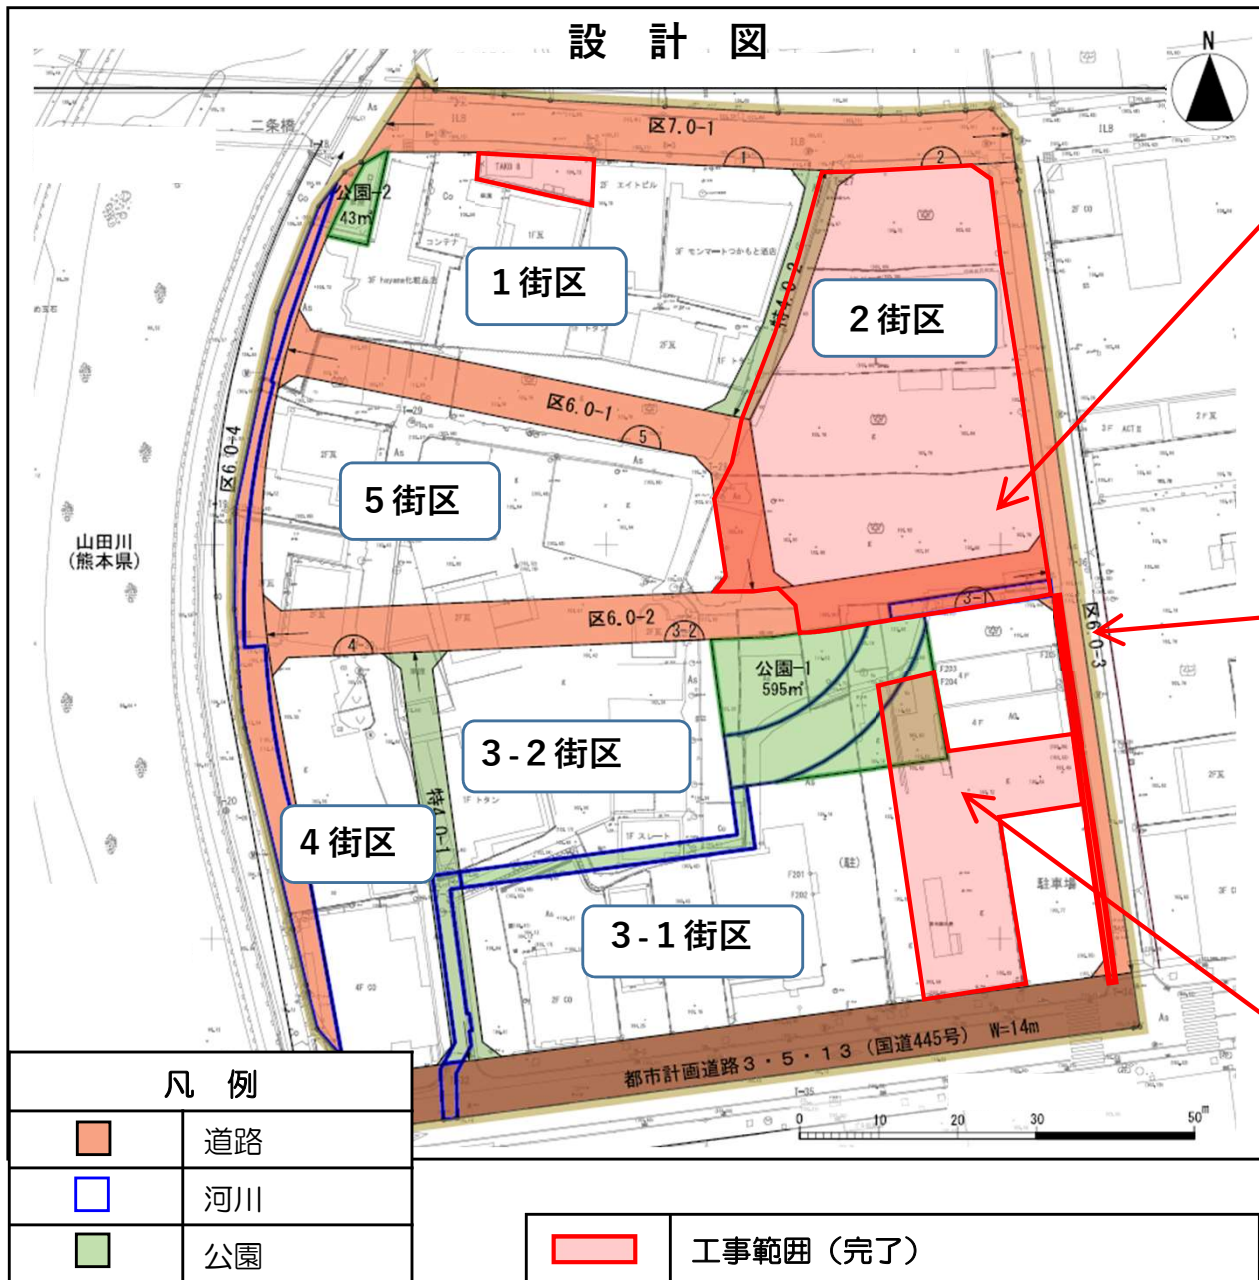

【施工完了】  
 施工会社  
 双栄建設 (株)

工事内容  
 側溝整備 136m  
 宅地造成 1,514m<sup>2</sup>

進捗率  
 100%



【施工完了】  
 施工会社  
 宮原建設 (株)

工事内容  
 側溝改良 46m  
 仮舗装 48m

進捗率  
 100%



【施工完了】  
 施工会社  
 (株) 曙建設

工事内容  
 縁石設置 43m  
 宅地造成 570m<sup>2</sup>

進捗率  
 100%

# 紺屋町土地区画整理事業 (工事)

2 街区 宅地造成



特4 - 2号線施工状況  
(1街区と2街区の間)



3 - 1 街区 宅地造成



特4 - 2号線側溝敷設  
(1街区と2街区の間)



# 交流・文化の場（うぐいす温泉周辺）社会実験関連

