

第 9 回青井復興まちづくり推進委員会

令和 6 年 1 0 月 1 日（火） 1 8 時 0 0 分～
人 吉 市

復興事業の取組状況について


青井土地区画整理事業 (換地)



凡例	
	街区内全部換地済み
	街区内一部換地済み
	工事着手箇所

仮換地指定面積等

	仮換地				
	画地数		換地地積		
全体指定計画	画地	%	㎡	%	
	107	(100.0)	33,158.43	(100.0)	
内訳	前回までの指定	72	(67.3)	22,023.56	(66.4)
	今回の指定	21	(19.6)	6,691.48	(20.2)
	<計>	93	(86.9)	28,715.04	(86.6)

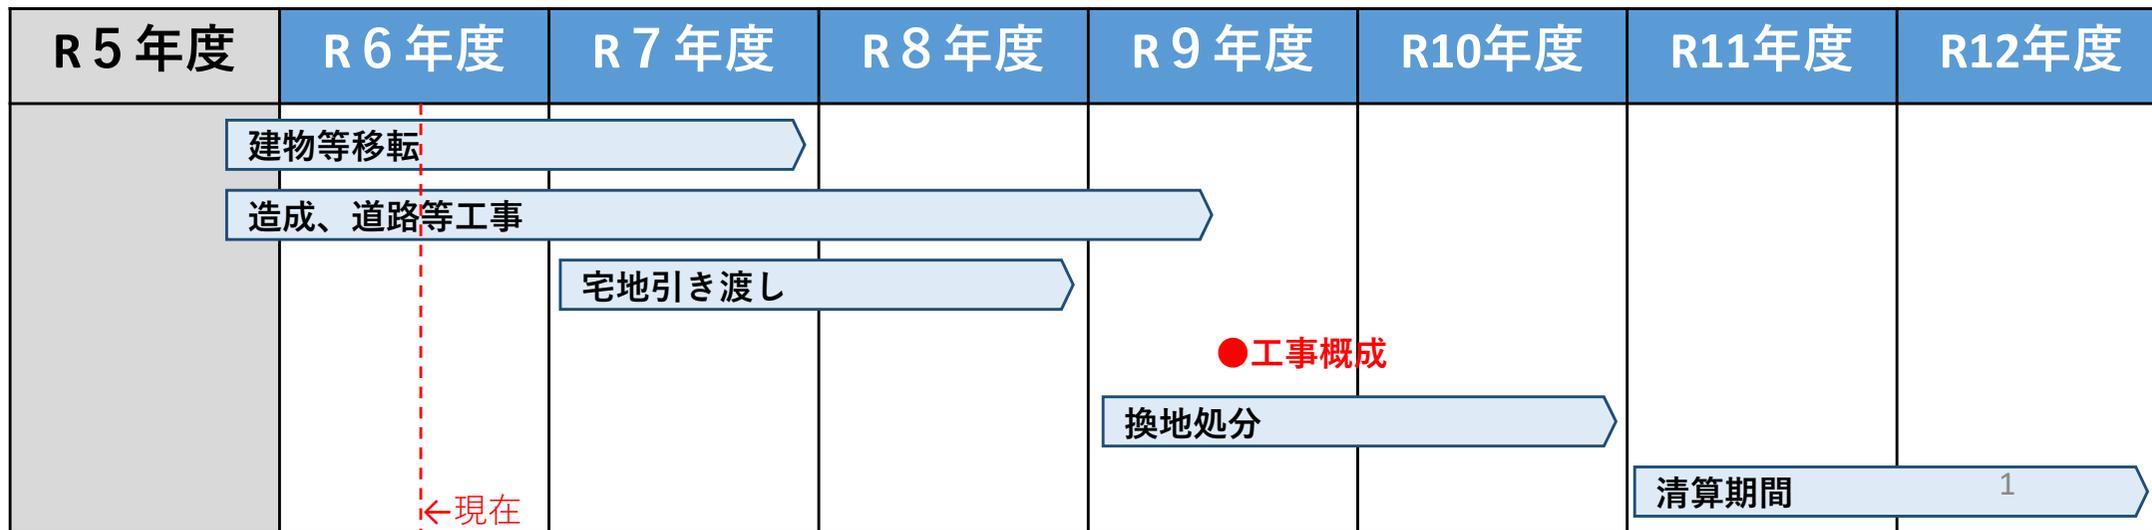

青井土地区画整理事業


竣工の様子



審議会の様子





青井阿蘇神社周辺賑わい拠点整備プロジェクト

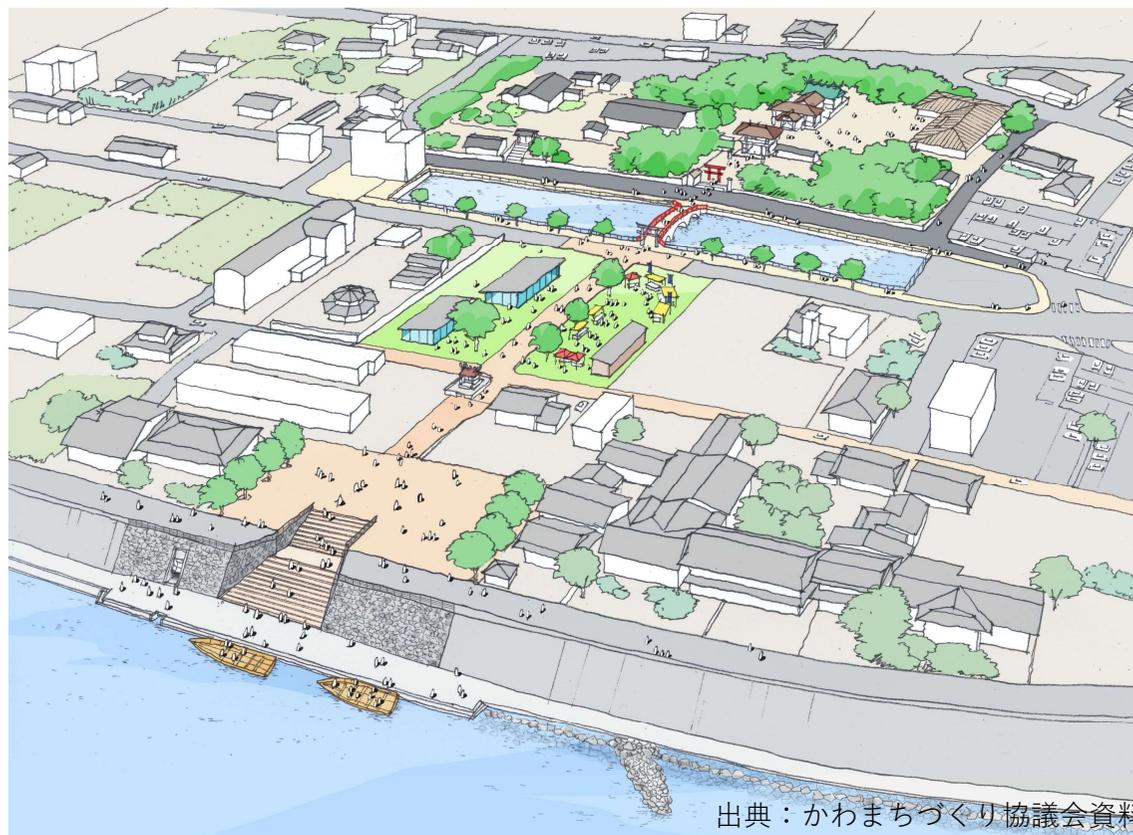

出典：かわまちづくり協議会資料

R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
	建物等調査						
	用地等交渉、建物等移転						
	デザイン検討						
		社会実験	社会実験				
		中央公園造成工事					
			詳細設計				
				公園、広場、参道、階段等整備			
	←現在					●供用開始	

(仮称) 西部公園 (構想)

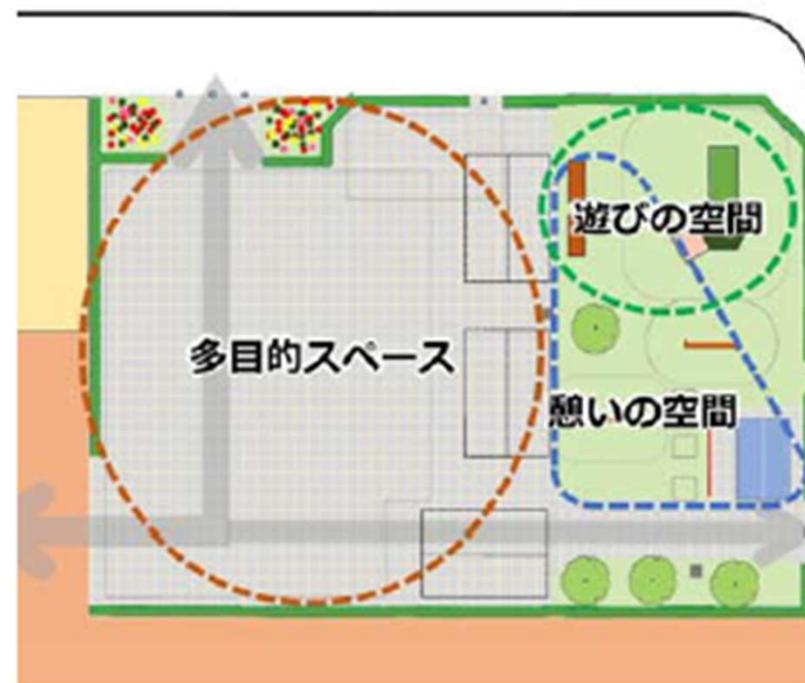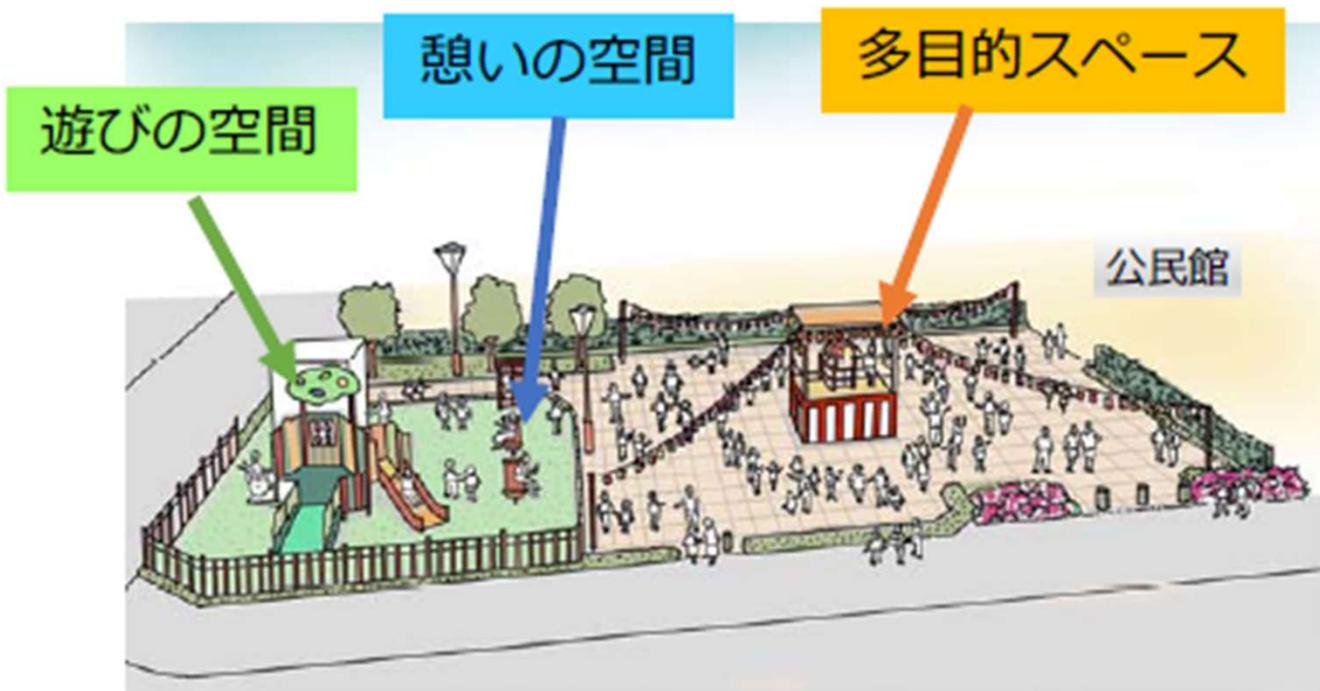

R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度	R11年度	R12年度
	公園施設詳細設計						
	住民座談会						
	社会実験						
		公園造成工事					
			公園施設工事				
				●供用開始			
	←現在						
