

復興まちづくり進捗状況説明会 (西瀬校区)

**令和4年11月
人吉市**

【次 第】

- 1 開会
- 2 復興まちづくりの進捗状況について
- 3 避難路整備の進捗状況について
- 4 質疑応答

目指すべき復興の将来像（復興計画より）

令和2年7月豪雨災害を経験し、私たちは球磨川とともに暮らすことについて、改めて深く考えさせられました。この災害を踏まえた中で、私たちはこれから生きる場所、立ち上がるグラウンドを決めなければなりません。

そして、私たちは災害を乗り越え、これからも安心して住み続けるために、あらゆる知恵を結集し、必要な取り組みを迅速に展開していく必要があります。

本市では、今年度から第6次人吉市総合計画をスタートさせました。計画では、「まちづくりの理念」として、これまで大切にしてきた価値を護り、育んでいくとともに、本市に住むすべての人々の幸せに繋げるための道標として、「みんなが幸せを感じるまち。ずっと住み続けたいまち。ひとよし」を掲げました。

「これまで大切にしてきた価値」の中でも欠かすことが出来ないものとして、常にまちの中心にあり、市民の心の拠り所となり、日々の生活を支え、多くの恩恵をもたらしてくれた球磨川への想いがあります。

災害からの復旧・復興を進めていくうえでは、球磨川をはじめとする自然が私たちのくらしと切っても切れない存在であることを認めつつ、今回の災害を教訓に市民・地域・行政等が一丸となって一日も早い復旧・復興を実現し、安心してずっと住み続けられるまち、次世代につながるまちを共に創り上げていく必要があります。

これらを踏まえて、復興の将来像（復興ビジョン）を次のとおりとします。

【復興の将来像（復興ビジョン）】

～希望ある復興を目指して～

球磨川と共に創る みんなが安心して住み続けられるまち

復興まちづくり計画の策定

令和2年7月豪雨

R3年3月

復興計画（指針・理念・方向性）

R3年4月～10月

地区別懇談会等における検討

- 地区毎の具体的な方針を踏まえた復興が必要
- 住民主体の復興まちづくりが必要

ソフト面

- ・住まい・生業の再建方法を検討
- ・避難のあり方や必要施設を見直し等

ハード面

- ・避難路・避難場所の整備
- ・災害公営住宅の整備等

都市計画

- ・防災性の高い建て方を誘導
- ・街区の整備の目標や計画の策定

その他

- ・流域治水対策と連携・調整
- ・流域治水における対策

個別の復旧事業

- ・災害査定
- ・道路の復旧 等

豪雨災害からの
復旧復興に向け
た大きな指針

R3年10月

地域毎の復興方針（具体的な取組案含）の検討

提案

復興まちづくり計画としてとりまとめ

※現在

各種復興事業の実施

- 地域住民
- 地域事業者
- 行政等

地区別懇談会



全体報告会

令和3年10月「人吉市復興まちづくり計画」策定（令和4年3月改定）



復興まちづくりに関する各種取組の推進

①被災者のくらし再建とコミュニティの再生

- 住まいの再建
- コミュニティの再生

②力強い地域経済の再生

- なりわいの再建


③災害に負けないまちづくり

- 避難対策 ■ 洪水に対する避難の考え方
- 復興まちづくり（まちなかの再生）
- 治水・土砂災害対策

災害を踏まえたまちなかのグランドデザイン

まちなかエリア：青井地区・中心市街地地区・麓・老地区

市街地の弾力的復興に向けて、防災上の課題解決とともに賑わいのあるまちなみ整備に向けた取組を進めています。人吉らしさや賑わいを発信する集客拠点“3つの杜”的形成と回遊促進を図り、それぞれの拠点が連携し、まちなか全体の活性化につながるように復興まちづくりを推進します

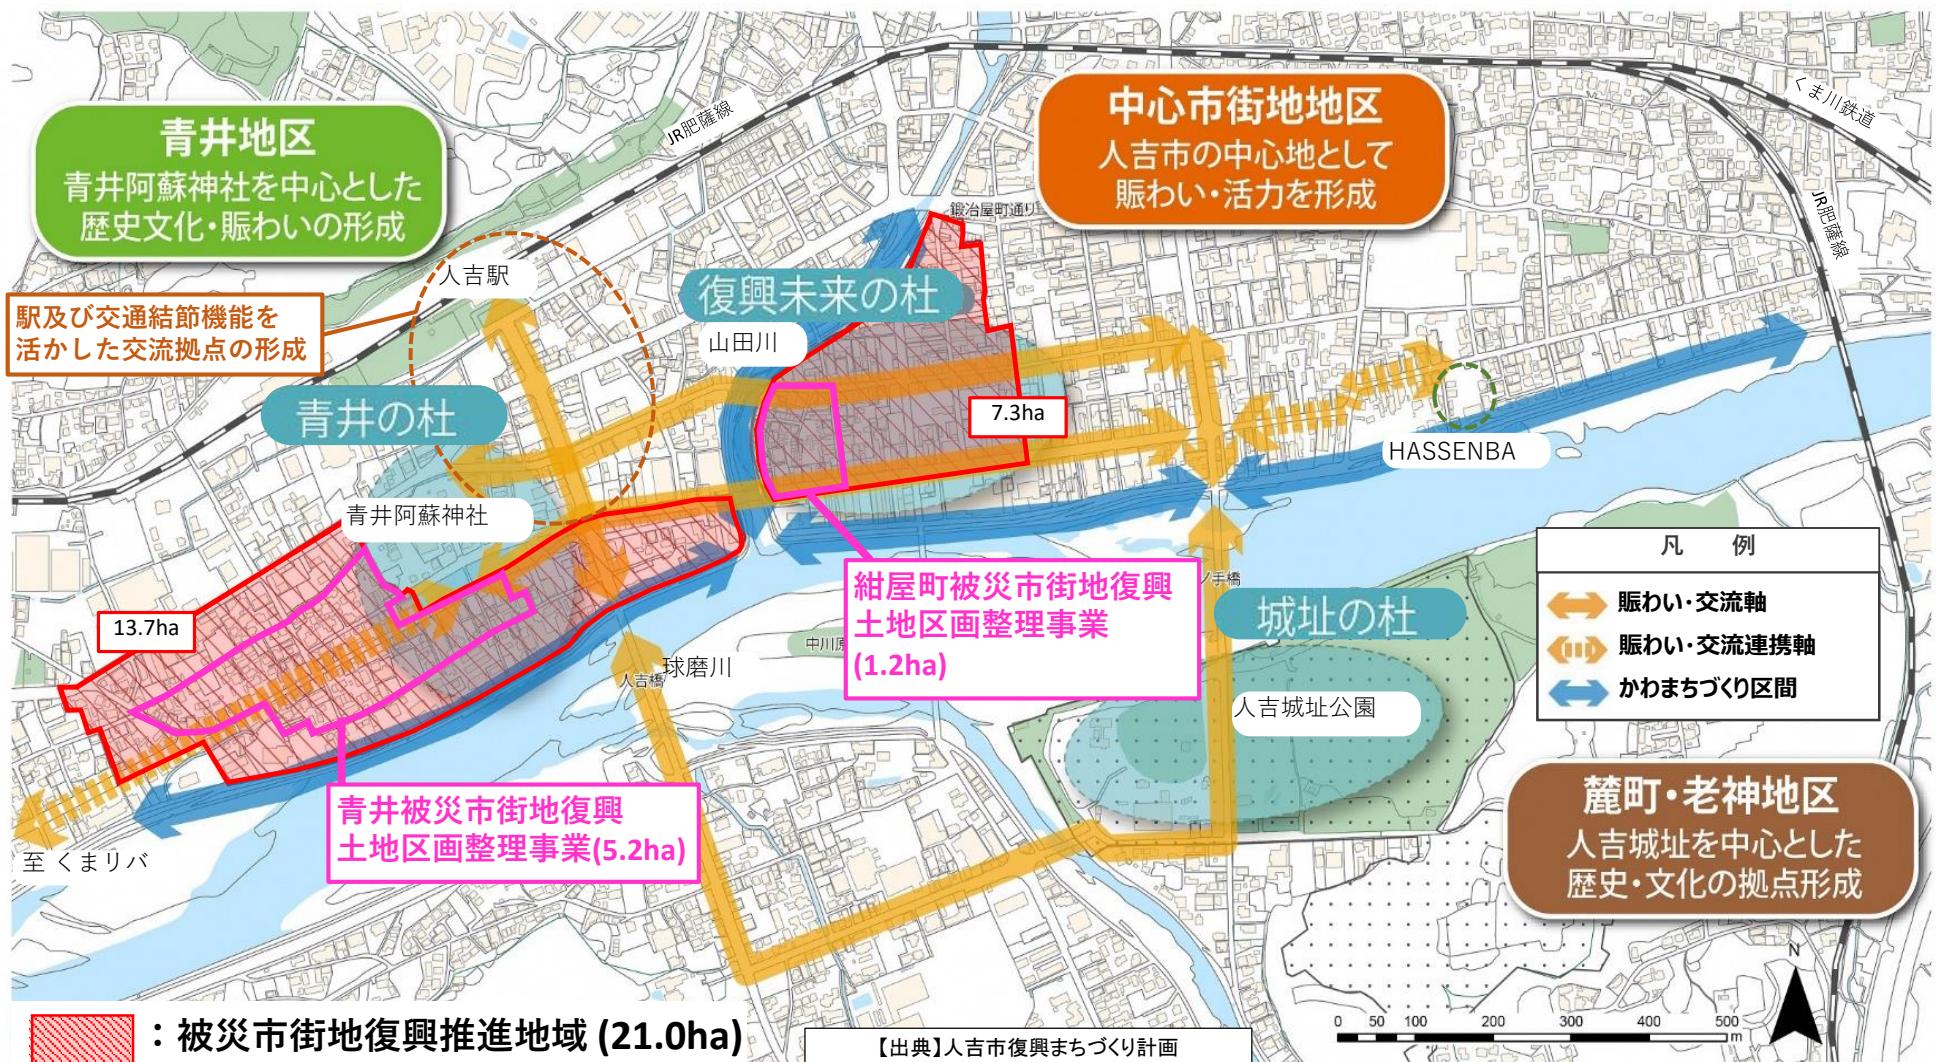

農地、農業用施設、林道の災害復旧


- R4.10月末時点における復旧状況（市全体）

農地：復旧工事対象件数 50件、復旧中 33件、完了 17件

農業用施設(市管理)：復旧工事対象件数 134件、復旧中 45件、完了 89件

林道：災害復旧事業対象 11路線・22箇所、復旧中 11箇所、完了 11箇所

- 農地・農業用施設、林道の復旧を**令和4年度までの完了**を目指し順次復旧作業を進めています。

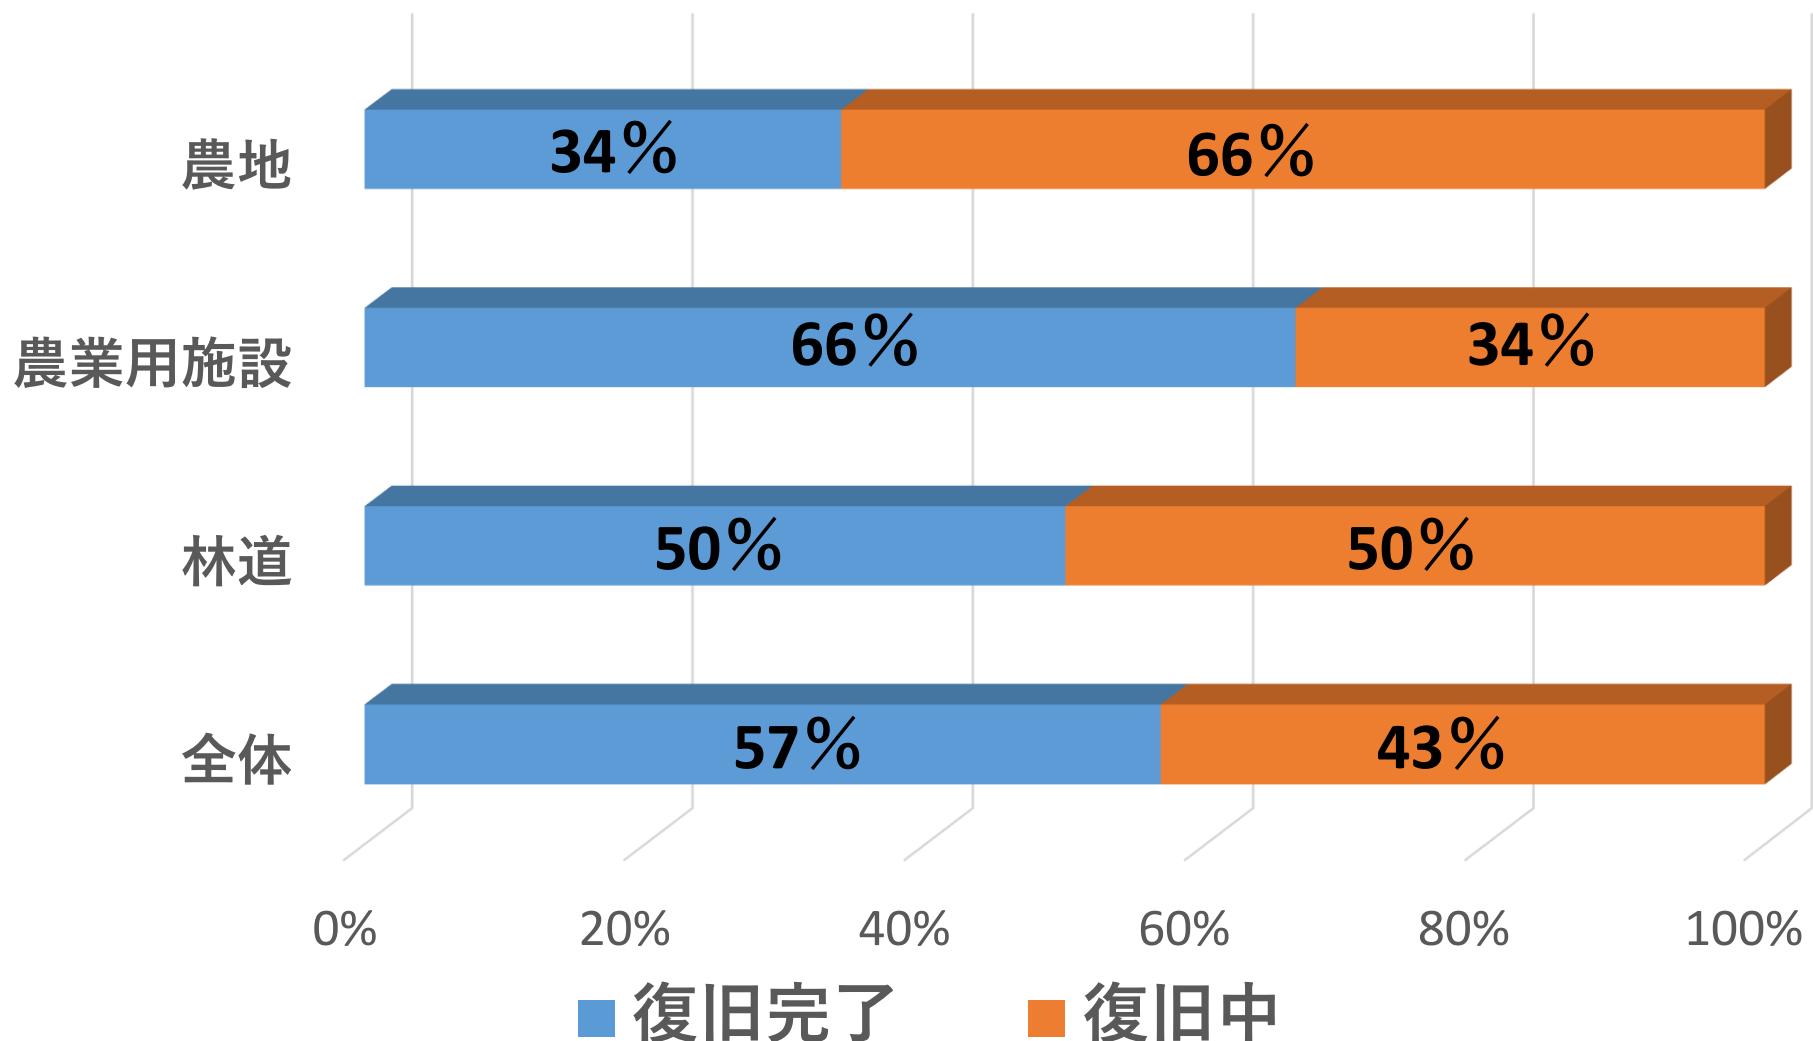

道路、橋りょう、河川（市管理分）の災害復旧


- R4.10月末時点における復旧状況（市全体）

道路：復旧対象 38箇所、復旧中 2箇所、完了 36箇所

橋りょう：復旧対象 5橋、復旧中 1橋、完了 4橋

河川：復旧対象 12箇所、復旧中 4箇所、完了 8箇所

- 市管理分については、復旧を**令和4年度までの完了**を目指し順次復旧作業を進めています。

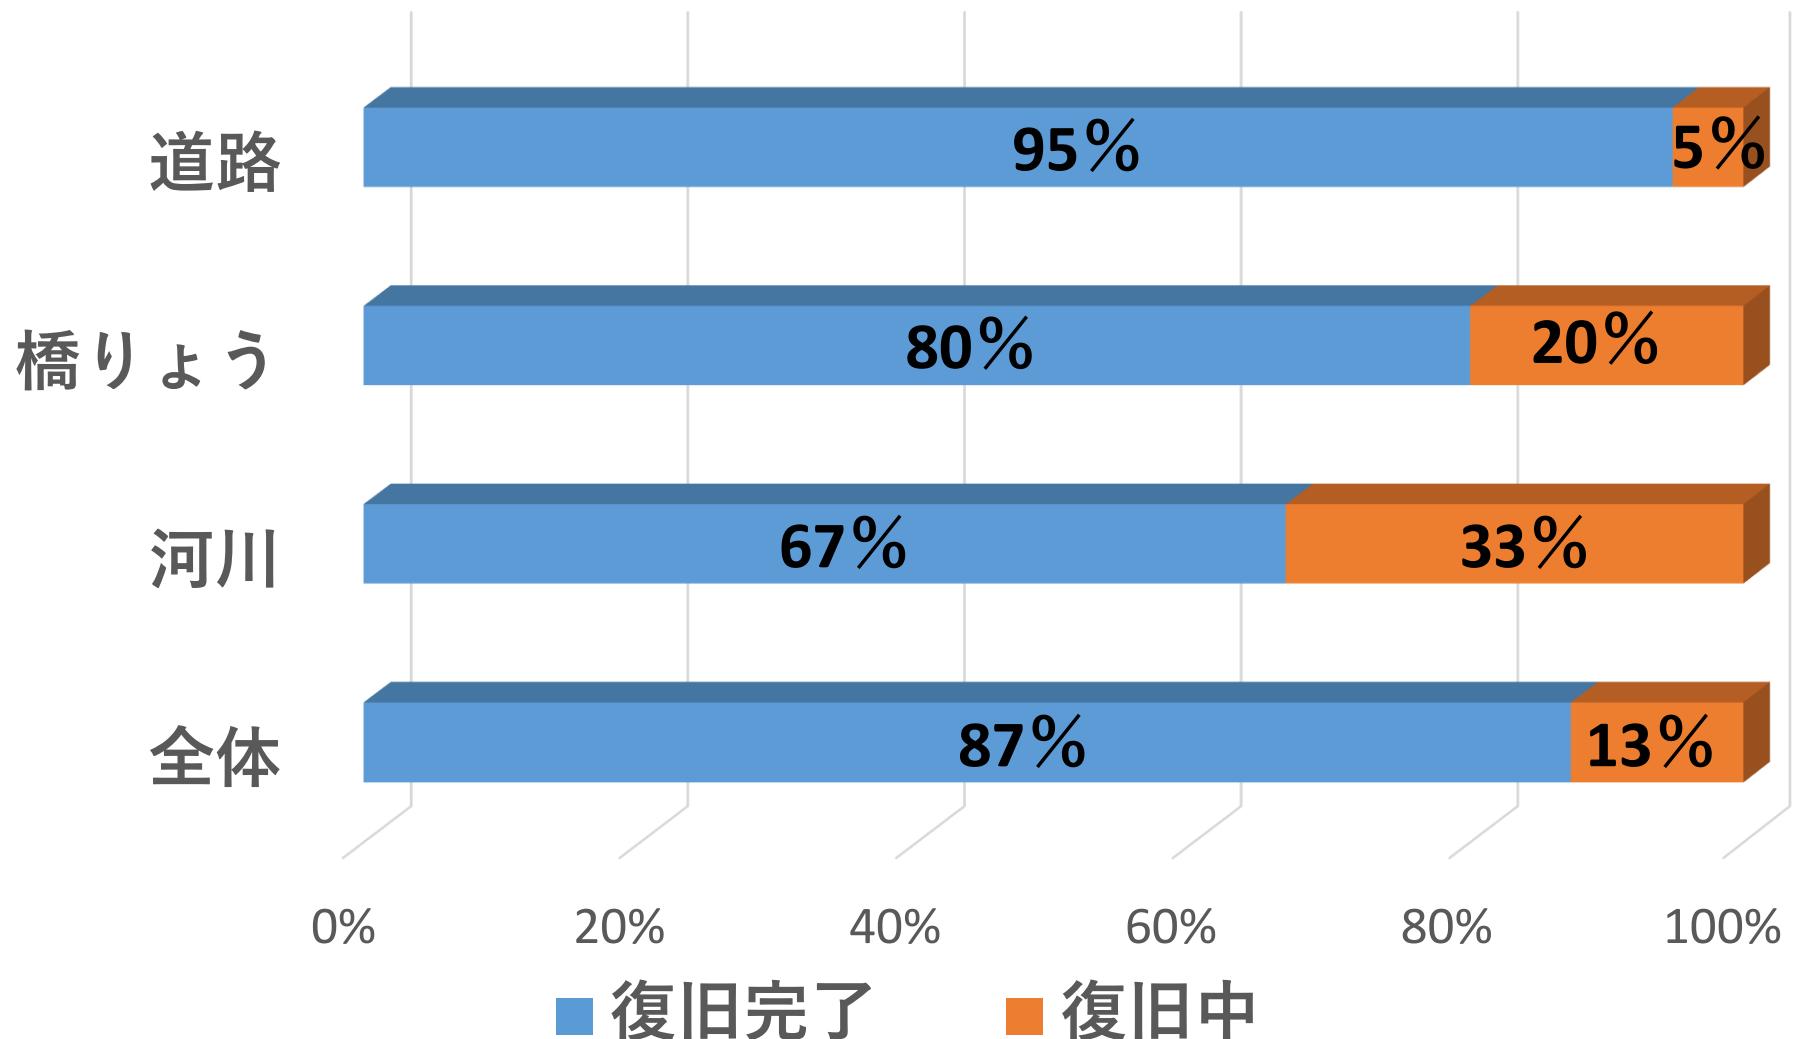

- 仮設住宅等に入居していた世帯のうち、約半数が退去し再建済。
- 住まいの再建の見通しが立っていない世帯については、
地域支え合いセンターと連携しながら引き続き支援を進める。

応急仮設住宅入居状況

単位:世帯数

	R3.3月末	R4.3月末	R4.10月末
建設型仮設住宅	340	266	203
みなし仮設住宅	460	343	163
公営住宅一時入居	131	113	75
合計	931	722	441

- 自力で住宅再建することが困難な被災者のために、災害公営住宅の整備や、建設型応急住宅（木造仮設住宅）の利活用により長期的な住まいの確保を支援

災害公営住宅の整備

- R4.11月末まで入居申込受付中（仮申込者のみ対象）

相良町

R 6.1月入居に向けて現在施工中

- エレベーター付き集合住宅タイプ（120戸）を整備。

東校区

R 6.5月入居に向けて準備中

- 55戸分の整備を東校区内で予定。

- R 4.12月下旬に事業者を決定する予定。



建設型応急住宅を長期的な住まいとして活用

- 建設型応急住宅を県から譲り受け、長期的な住まいとして被災者へ供給。

村山あやめ広場仮設団地

西間第一・第二・第三仮設団地

下原田第一・第三仮設団地

6箇所を整備

- R 6.3月下旬入居に向けて準備中



被災した社会教育施設の復旧

東西コミュニティセンター

- 現在の場所に復旧。
- 浸水対策として空調設備の室外機等の嵩上げ工事や、消火ポンプ室への浸水を防ぐ止水壁の設置工事等を実施。
- 現在工事中でR4年度完了予定。



被災時

**現地に復旧予定
(原形復旧)**



西瀬コミュニティセンター

- 場所を隣接地（西瀬コセン第二駐車場）に移転し復旧。
- 既存施設解体済(R4.9末)。現在、土地造成工事に着手(R5.3末完了予定)。
- R5年度に新築工事着手 R6年度完了予定。



被災時

**移転予定地：
西瀬コセン第二駐車場**



人吉城跡の復旧状況




中川原公園の復旧について

● 中川原公園の復旧内容（予定）

- ・公園地盤高を約 2 m掘り下げて復旧（芝生広場）。
- ・公園施設、トイレ、遊具は設置しない。
- ・復旧後の中川原公園の利活用については、かわまちづくり等において市民の皆様に意見等をいただきながら検討。

● 中川原公園の復旧スケジュール


令和4年9月 国による地盤下げ工事着工
 令和5年3月 地盤下げ工事完了予定
 令和5年度～ 市による災害復旧工事予定

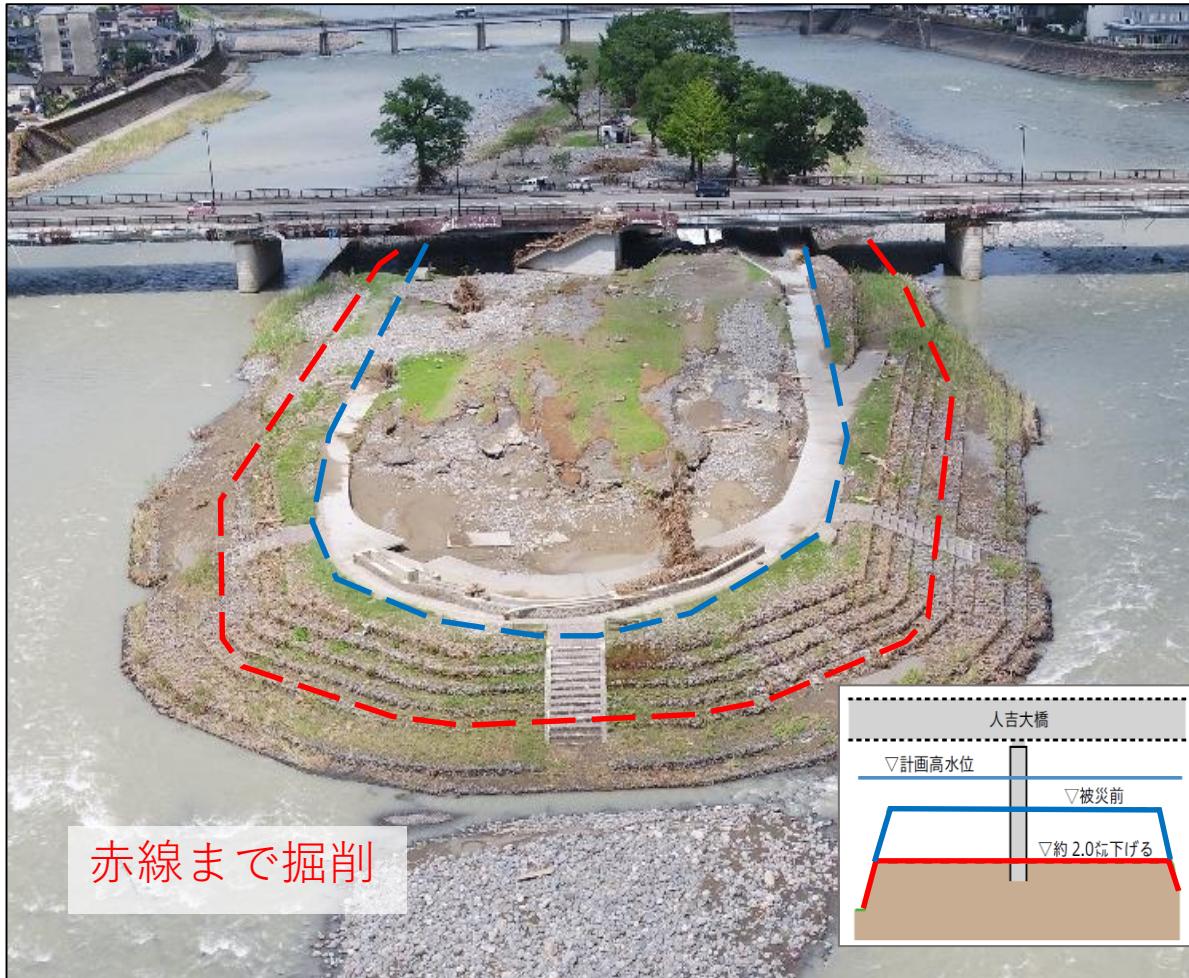

中川原公園平面図




くま川鉄道の復旧

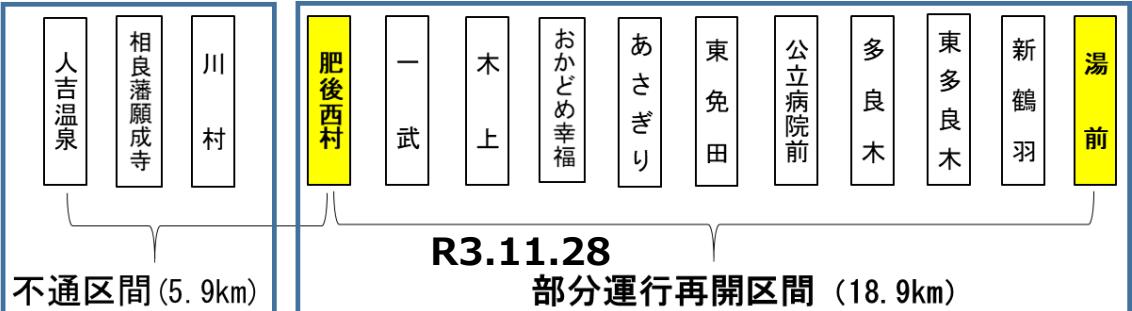

球磨川第四橋梁復旧イメージ(川村駅～肥後西村駅間)



不通区間の復旧スケジュール

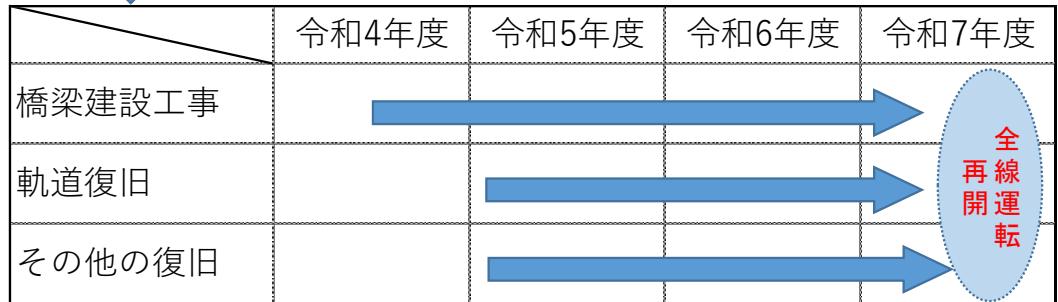

令和7年度中の全線運転再開を目指します

肥薩線の復旧

○ JR肥薩線検討会議

復旧方法、復旧後の肥薩線の在り方について検討

○ JR肥薩線再生協議会

復旧に向けた方策、今後の利活用策等について協議

○要望活動

JR肥薩線再生協議会、肥薩線利用促進・魅力発信協議会

- ・部分運行、全線鉄道での復旧
- ・新たな観光列車の運行
- ・財政支援措置 等々

○肥薩線復旧を願うアピール集会(令和4年3月20日)



まちなかの賑わい創出



HITONOWAマーケットをまちなかで定期開催 (人吉商工会議所 R4.3月~)

ひかりを活用した観光再生の取組



観光拠点をひかりで演出する取組 (人吉ひかりの復興プロジェクトによる官民連携の取組)

新たな観光プログラム開発



民間事業者主体の飲食店街整備の取組『紺屋小町』（R4.12完成予定）

遊水地整備について（中神地区）



遊水地整備について（大柿地区）



通行止め開始【車道・歩道部】：令和4年12月24日（土）9時～
 新橋完成予定【歩道部】：令和5年 1月上旬頃
 【車道部】：令和5年 2月下旬頃



西瀬橋 新橋架替に伴う迂回路案内



これまでの河道掘削の実施状況(人吉市)

実施箇所

○球磨川河道内の掘削を行っており、令和4年9月末現在約172万m³を撤去。引き続き、堆積土砂の掘削を推進。

○令和4年9月末までに人吉市では10箇所の河道掘削を実施。



【施工前状況】



【施工後状況】

【施工前状況】



【施工前状況】

61k800右岸
水の手橋下流付近

③



R3.3

【施工後状況】



R3.5

【施工後状況】

59k400右岸
西瀬橋下流付近

④



R3.5



R3.7

63k400左岸
球磨川第3橋上流付近

⑤



R3.5



R3.8

59k000左岸
西瀬橋下流付近

⑥



R3.12



R4.3

57k200左岸
西瀬橋下流付近

⑦



R3.12



R4.5

55k200左岸
紅取橋下流付近

⑧



R4.1



R4.6

【施工前状況】

55k750左岸
紅取橋下流付近

⑨



R4.1

【施工後状況】



R4.6

【施工前状況】

61k200中州
中川原公園際付近

⑩



R4.1



R4.6

～“緑の流域治水”の取組み～

堆積土砂の撤去など河川の緊急対策（県管理区間）

＜発災から2年の取組みと成果＞

◆ 堆積土砂撤去・河道掘削

- ・県球磨地域振興局が管理する河川（万江川など）について、令和3年5月末までに、約83万m³（うち人吉市管内約16万m³）を撤去し、令和2年7月豪雨で堆積した土砂の撤去完了
- ・更に、その後堆積した河道内の土砂について、令和4年5月末までに、約20万m³（うち人吉市管内約3万m³）を撤去完了

◆ 河川情報の充実

- ・水位計12基、河川カメラ11基を増設（※）
- ・夜間でも河川の状況が確認できるよう、河川カメラへの照明設備追加 （※）権限代行含む

山田川（人吉市紺屋町・駒井田町）



福川（人吉市下林町・下薩摩瀬町）



＜今後の展望と取組み＞


◆ 堆積土砂撤去・河道掘削

- ・引き続き、流域住民の声をお聞きしながら、出水に備え、河川の流下能力の維持・向上を図る

◆ 河川情報の充実

- ・河川カメラの増設等の検討

万江川（人吉市上原田町）



御溝川（人吉市駒井田町）



鹿目川（人吉市下戸越町）



町内公民館（自治公民館）の復旧

- 市内全域では27町内会の自治公民館が被災し、22町内会の自治公民館は復旧完了

西瀬校区

●復旧完了した自治公民館



下戸越町公民館



相良町公民館



上薩摩瀬町公民館



下薩摩瀬町公民館

地域の組織で管理している未指定文化財（地域コミュニティ施設等）の復旧

- 被災を確認している29施設のうち、復興基金を活用して5施設が復旧完了。

西瀬校区

●被災を確認している施設一覧

- ・薩摩瀬神宮
- ・唐渡神社
- ・下薩摩瀬釈迦堂
- ・宝来薬師堂・地蔵堂
- ・庚申塔



庚申塔
復旧状況



唐渡神社
復旧状況



下薩摩瀬釈迦堂
復旧状況

みんなの家の整備


- 被災した5町内会に上新町を加えた6町内会を対象に、被災した公民館に替わる「みんなの家」を4箇所整備（日本財団による支援）。R4年度着工、R5年度引渡し目標。

宝来町 … 令和4年度中の着工を目指して地元町内会及び関係者と協議中




青井地区：整備の方向性

主要項目(整備すべき主な機能)

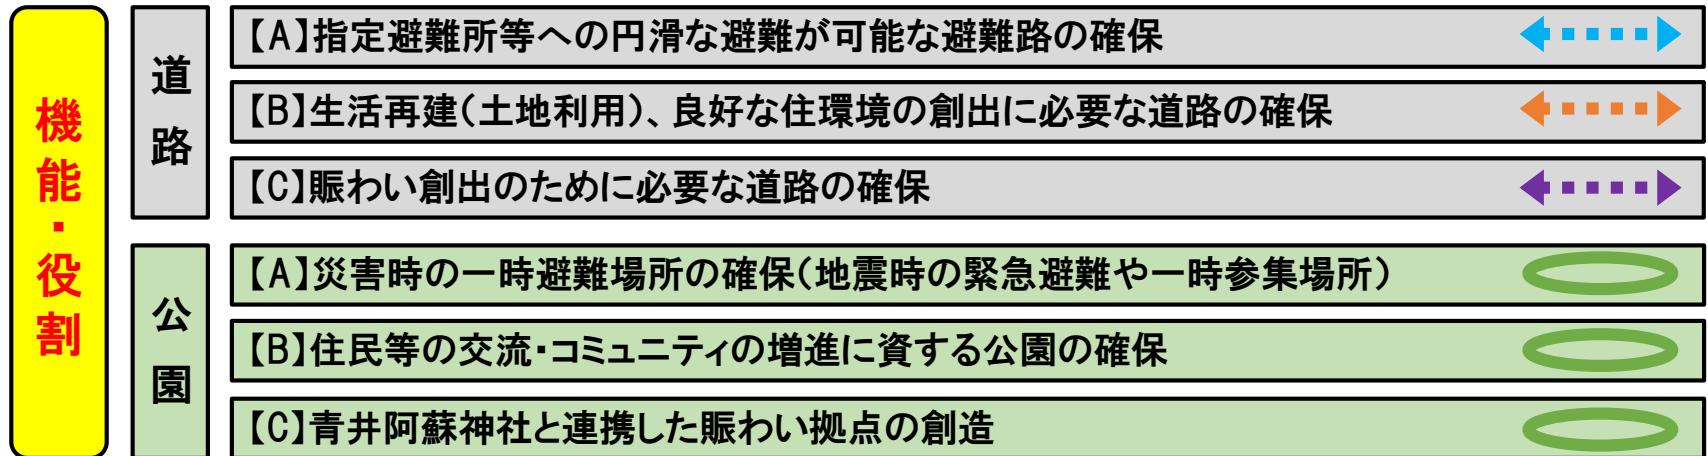

道路・公園等の公共施設配置(案)

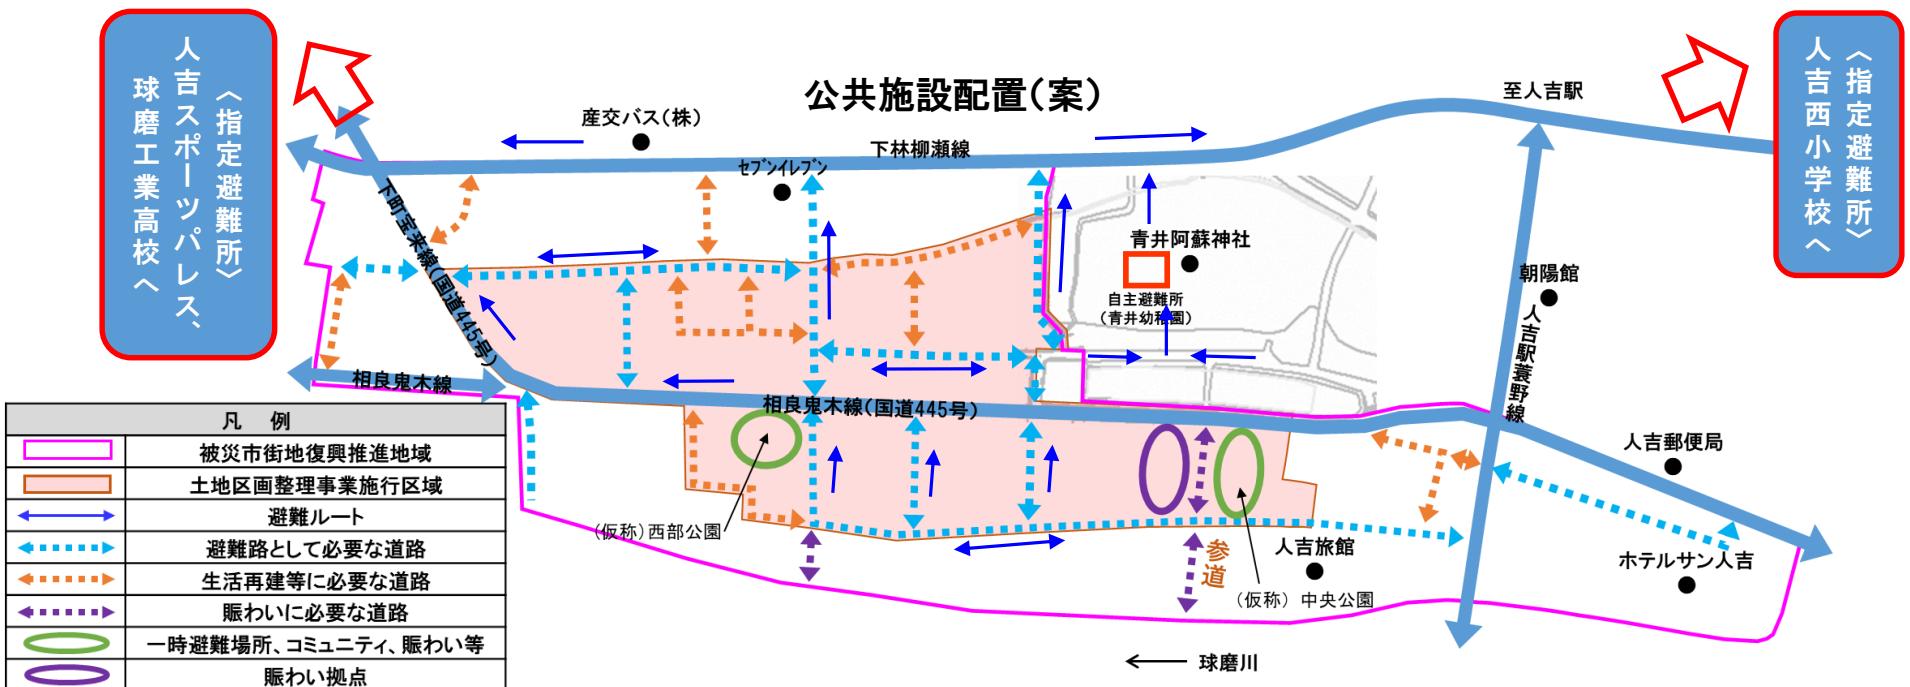

防災・避難情報の発信体制強化

防災・避難情報を確実に！分かりやすく！住民へ伝達する取組強化

防災ラジオ



屋内でも防災行政無線放送を聞くことができる防災ラジオを各家庭、事業所にも配布

防災ポータルサイト



球磨川などの河川情報、避難所情報など、防災・災害情報をまとめたサイト。防災ラジオの放送履歴、水の手橋のライティング防災アラートの様子も確認できます。

<防災ポータルサイト>



ポケコム (デジタル避難所システム)



指定避難所の混雑状況が確認できるシステム

<ポケコム>



SNS活用



市公式SNSで、防災・避難情報や日々のお知らせを発信しています。

市公式LINE



@hitoyoshi_city
市のイベント情報なども日々発信

市公式Twitter



@hitoyoshishi

市公式Facebook



@hitoyoshishi

Yahoo!防災速報アプリ



「地域の設定」で「人吉市」を設定してください

ライティング防災アラート

球磨川の氾濫危険度を水の手橋の照明色の変化で視覚的に知らせます。緊急時は川や橋に近づかず防災ポータルサイトで確認しましょう！



危険レベル（水の手橋の色）
※写真はイメージです。



危険レベル①
(白色)



(電球色)



安全安心な避難所運営の見直し

指定避難所の見直し

- 令和2年7月豪雨災害を受け、被災した指定避難所の除外、河川沿いに位置する指定避難所は通常開設する避難所から変更するなど指定避難所の一部見直しを実施。

(見直しを行った指定避難所)

- ・東西コミセン、西瀬コミセン ⇒ 指定避難所から除外
- ・保健センター ⇒ 当初開設避難所は「人吉第一中学校」へ変更

(R4.10台風14号時に追加で開設した避難所)

- ・人吉高校
- ・球磨工業高校
- ・中小企業大学校
- ・人吉第二中学校

避難所の感染症対策強化

○台風14号では臨時で感染者用避難所を開設

○総合防災訓練において新型コロナを含む感染者対策訓練を行った。

- ・新型コロナや各種感染症患者とのゾーニングを実施
- ・受付や感染症患者の嘔吐物の処理対応を実施

指定避難所へ災害備蓄倉庫整備

- 非常時に必要な備蓄物資を、身近な場所で確保するため、災害備蓄倉庫を指定避難所(9箇所)へ整備。



地域の防災力強化

地域の防災研修・防災訓練



地区防災計画策定



西瀬校区

避難訓練参加状況

**【R 4 年度】
出水期前の自主避難訓練 約 101 名**

地域の防災力強化

地域の防災研修・防災訓練

避難訓練参加状況

中原校区


**【R 4 年度】
出水期前の自主避難訓練 約 36 名**



高台の避難場所の確保（村山台地）

高台の村山台地内に、大規模水害等の際に、緊急的に車で一時的に避難できる場所の整備に向けた取組を進めています。
(初期避難の場所として検討中)

- ・予備設計を現在実施中
- ・今後、地質調査を行ったうえで令和9年度の完成を目指に取組を進めます
- ・整備面積：精査中

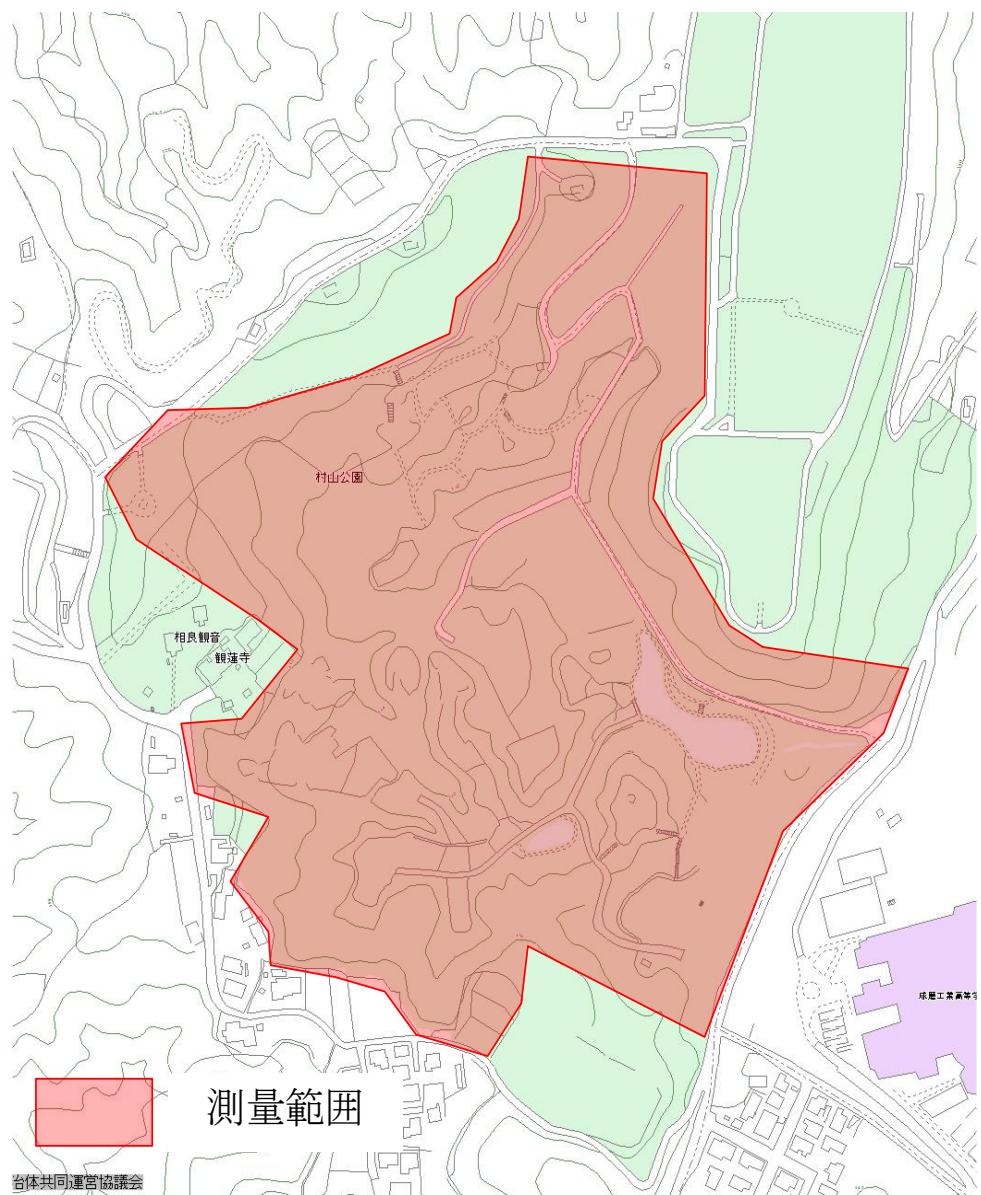


防災ステーション整備事業

- 人吉市では復興まちづくり計画に「防災機能の強化など災害に備えた地域づくりに資する拠点づくりの促進」として防災拠点整備についても位置づけを行っています。
- 令和2年7月豪雨で甚大な被災を受けた薩摩瀬地区においては、当該地区の地権者の多くの方からも土地協力の声もあり、市全体を見据えた災害に備えた地域づくりに資する拠点づくりを目指しています。

◆河川防災ステーション整備事業スケジュール（案）

	初年度	2年度	3年度	4年度	5年度	運用開始
整備計画作成・測量・設計						
計画申請・承認		■				
用地買収・交渉・契約			■			
整備工事（盛土造成）				■		
備蓄資材・水防センター整備等					■	

○河川防災ステーションの活用【イメージ】

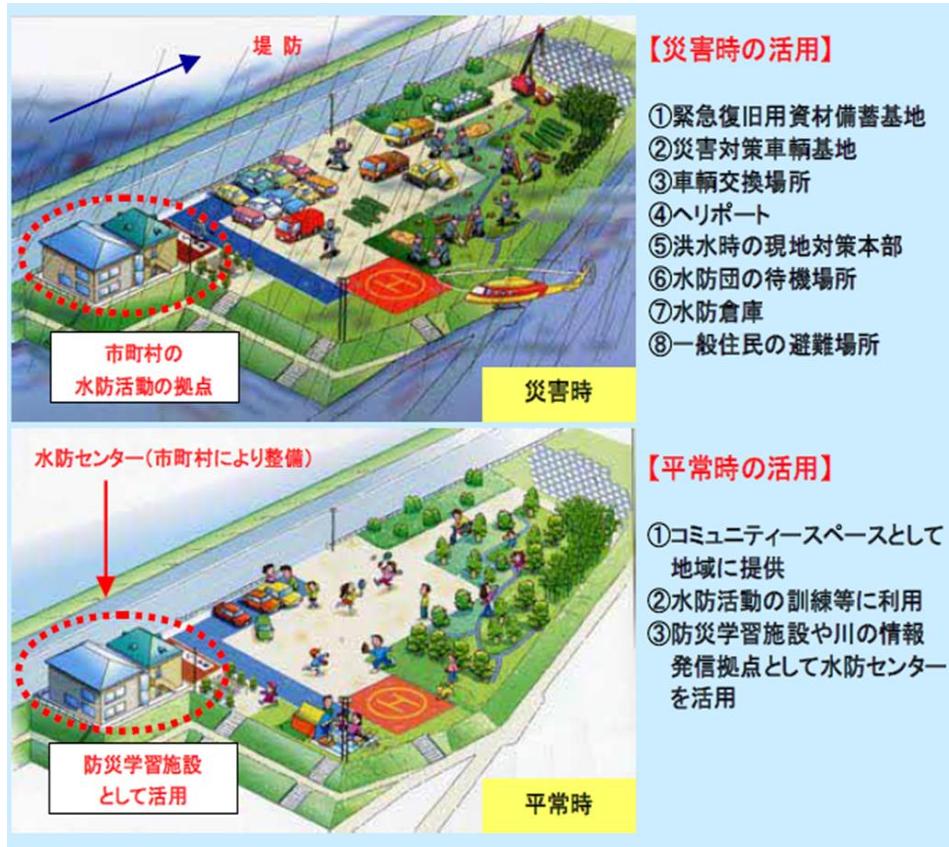


※国土交通省のHPより引用

避難所等の整備

住民からの意見

- 指定の場所以外にも複数確保しておく必要がある

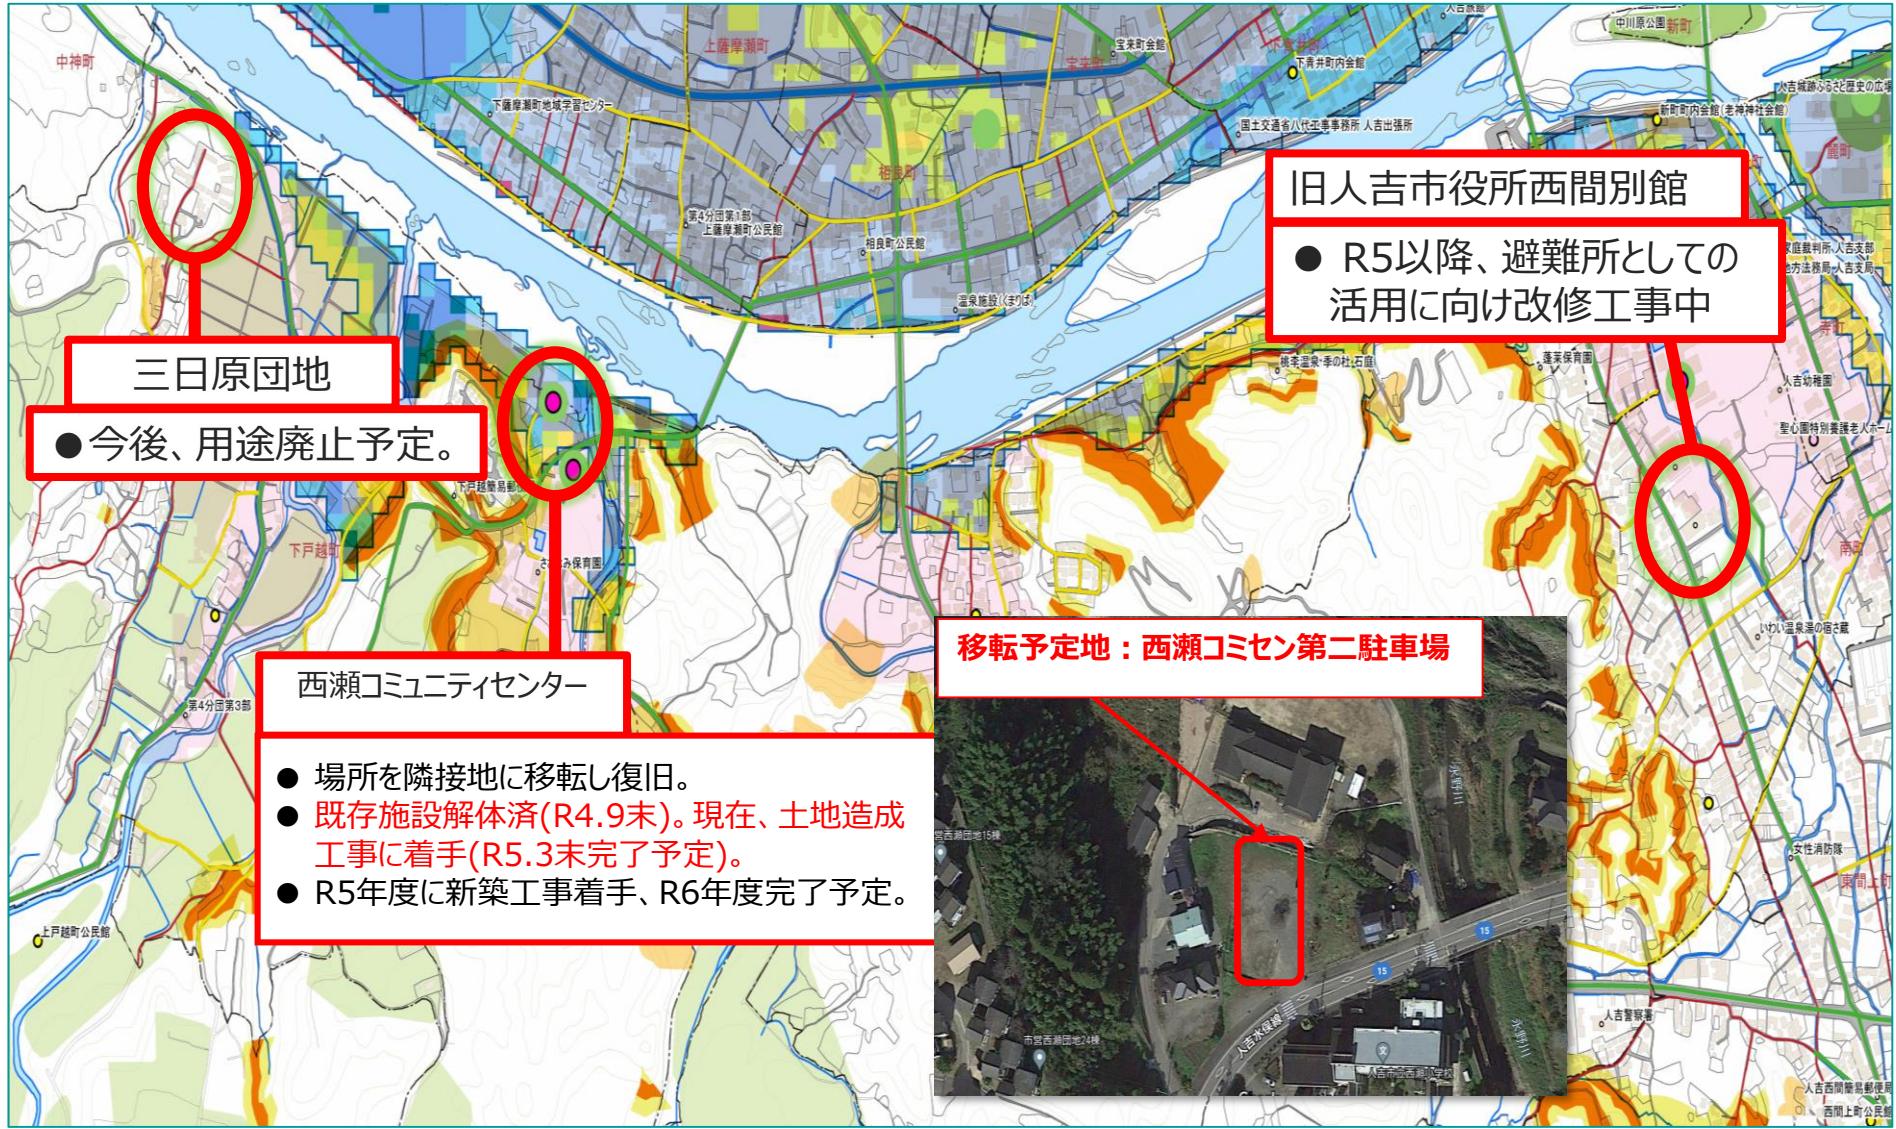

復旧復興状況の情報発信

国・県市の取組状況を一冊に お知らせ（毎月発信）

仮設住宅みんなの家、市内各所に
掲示しています。市ホームページ
でも確認いただけます。

球磨川流域の復旧・復興に 向けた国県市の取組状況 (毎月発信)

道路や河川、農地などの復旧進捗、治水対策や復興まちづくりに向けた動きなど、国県市の動きを一体的にお知らせします。ぜひご確認ください。



* 揭示場所 *

- ・建設型仮設住宅内みんなの家
 - ・市役所本庁舎ロビー
 - ・ニシムタ人吉店 人吉郵便局
 - ・肥後銀行人吉支店、人吉駅前支
 - ・スポーツパレス カルチャ-

[市ホームページへ
リンクします](#)



広報ひとよし「復旧復興情報」 (毎月発信)


各分野の復旧復興 情報をお知らせ



避難路整備の進捗状況について

避難路整備要望状況（川北地区）


【R 3年度地区別懇談会等から】

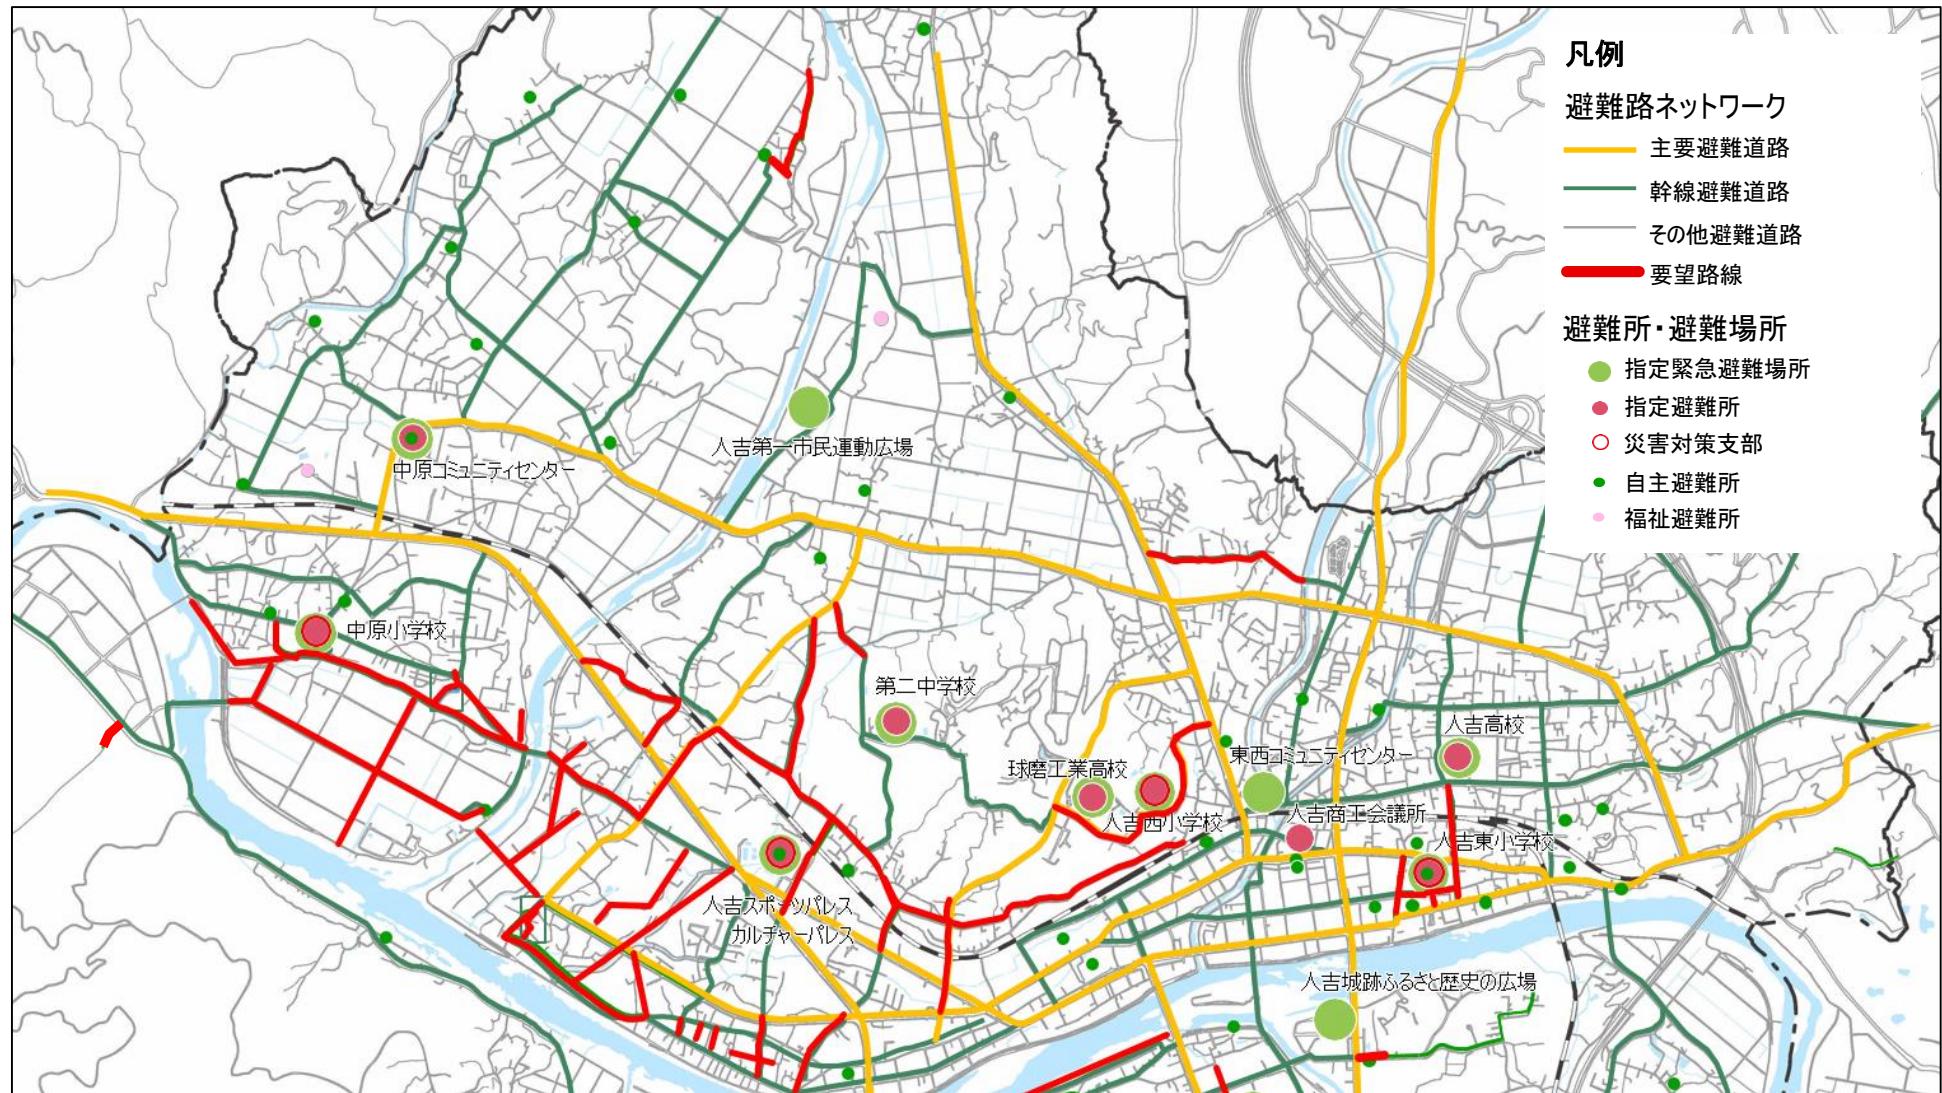

※国県道及び都市計画道路は除く。
※赤線は要望路線であり、整備実施路線ではありません。

避難路整備要望状況（川南地区）

【R 3年度地区別懇談会等から】

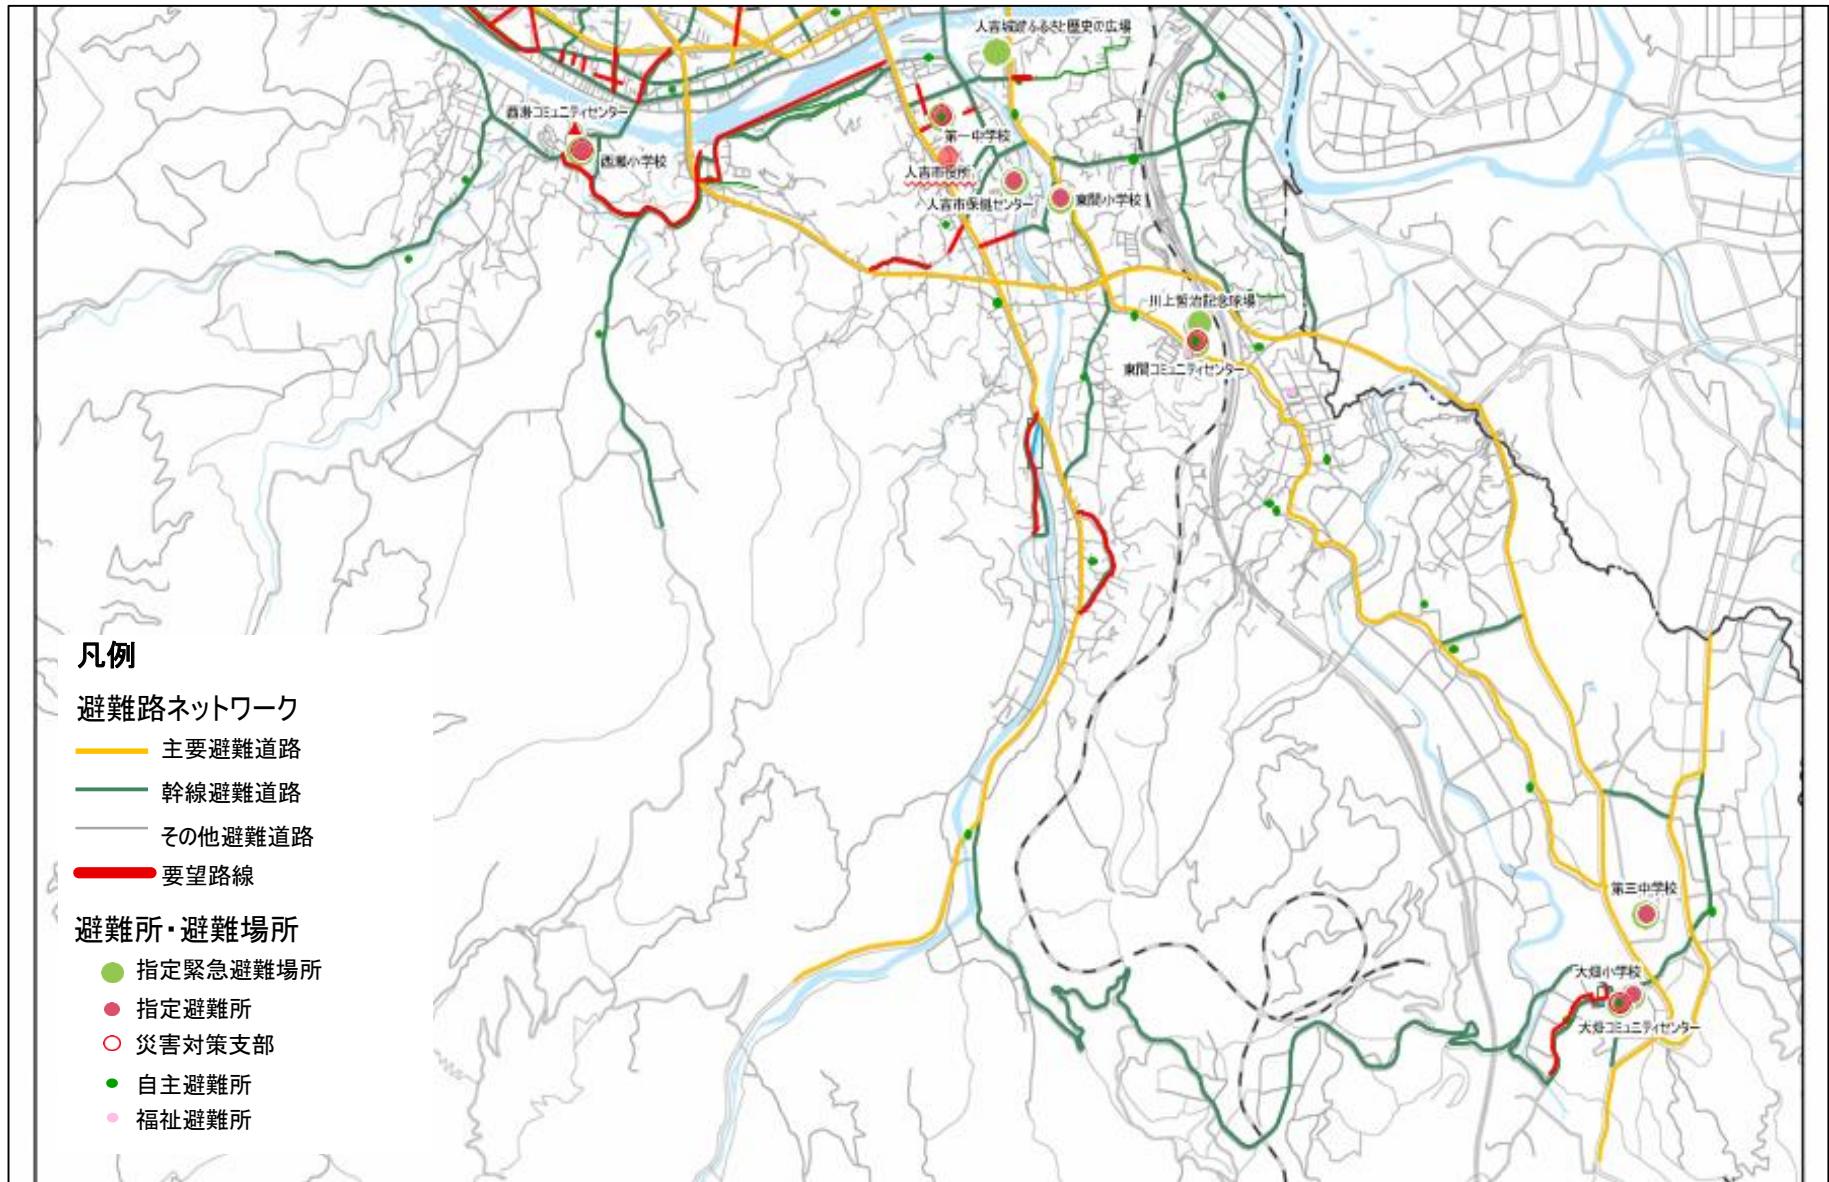


※国県道及び都市計画道路は除く。

※赤線は要望路線であり、整備実施路線ではありません。

避難路整備の考え方

- 要望があった路線の整備は、相当の期間が必要。→整備実施路線の選定が不可欠
- 地区別懇談会で挙げられた意見や、これまでの整備課題等を基に復興事業導入可能性調査(FS調査)を実施しています。
- 市内の道路網の形成状況や、避難行動に伴う各路線の利用のされ方等を踏まえ、安全に避難所まで移動できるような避難路を確保するため、整備実施路線の検討を行っています。

避難場所、避難所の定義を踏まえた避難路ネットワークのイメージ

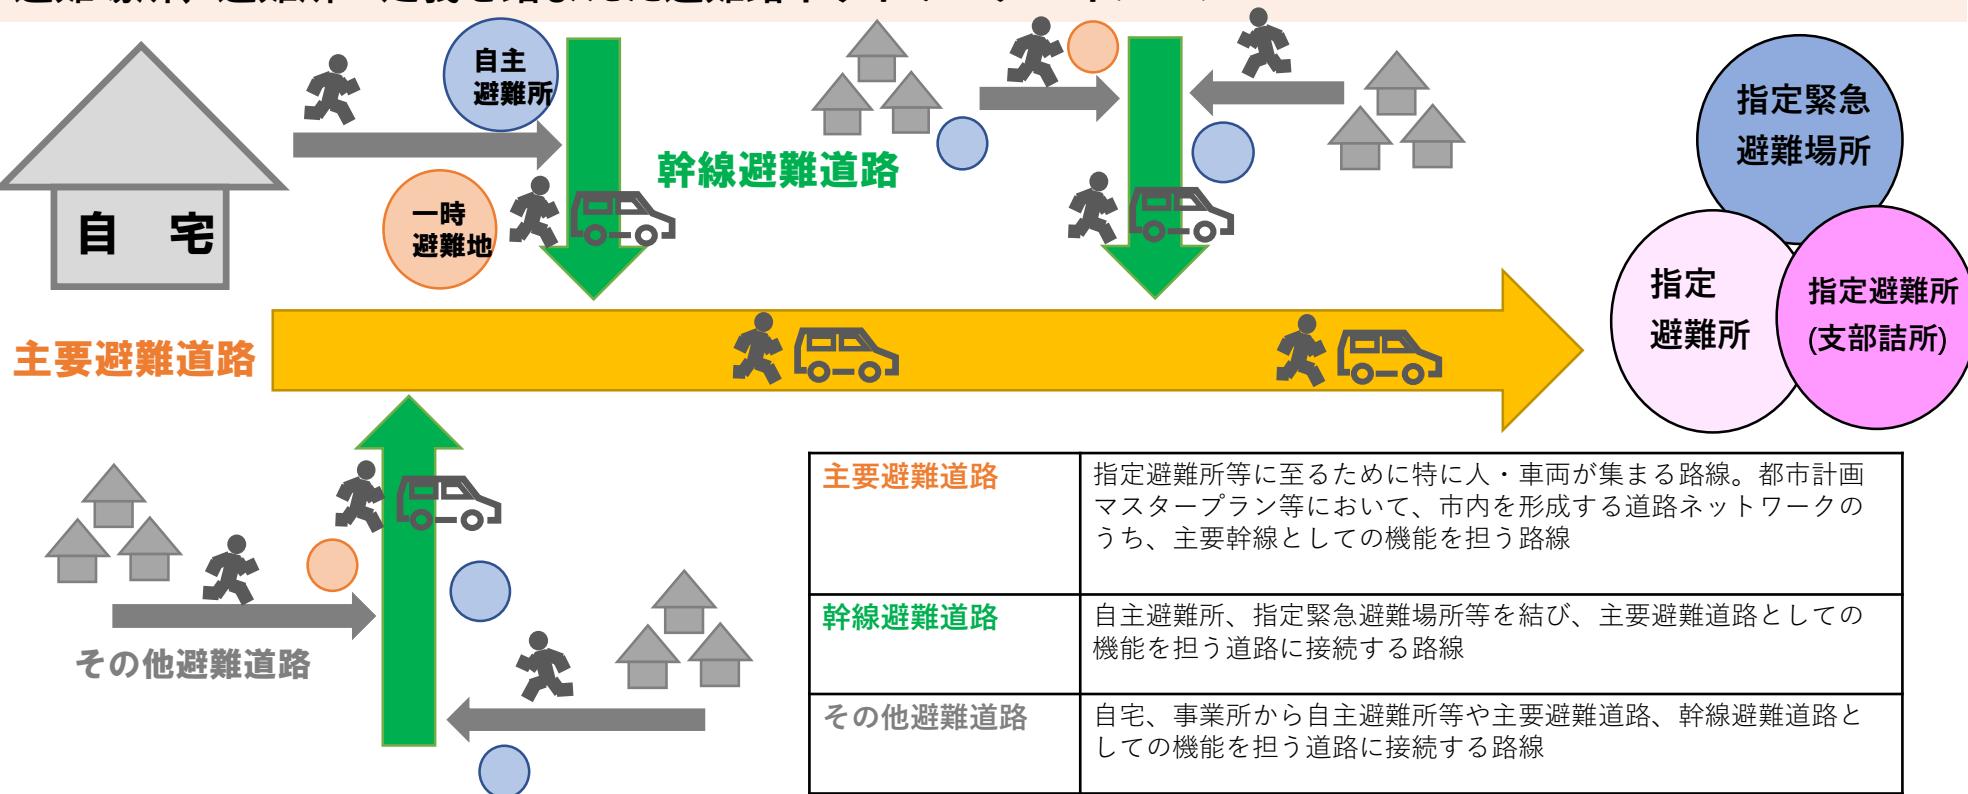

今後のスケジュール予定

令和 4 年度

8月	復興建設部による現地踏査
9月	9月議会補正予算可決（測量設計予算）
10月～	測量設計業務を随時発注中
12月	12月議会補正予算（測量設計予算要求予定）
令和 5 年 1月～	各校区への避難路整備説明会 測量設計業務を随時発注予定

令和 5 年度

4月～3月	事業化路線整備方針案策定 地元説明会 各路線の整備計画説明会（隨時） 事業路線の用地交渉等
-------	--
